



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Molise
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise
Campobasso

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO N. ABAP/03/2018

CUP F71E18000100002

Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. – Linea d'intervento "Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" – Azione "Molise Archeologico – Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 25 febbraio 2018.

Venafro (IS) – Teatro e Domus

Attività di scavo, restauro e allestimento didattico per la fruizione pubblica del sito

Spesa prevista in € **550.000,00** (Euro cinquecentocinquantamila/00)

Campobasso 04 OTT 2018

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa **Maria Diletta Colombo**

IL PROGETTISTA
Arch. **Pierangelo Izzo**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F. T. Ennio Notaridonato

Comune di VENAFRO
(Isernia)

Patto per lo sviluppo della Regione Molise - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020
Delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. Area tematica "Turismo, Cultura e
Valorizzazione Risorse Naturali" – Linea d'intervento "Programma integrato per lo
sviluppo e la promozione del turismo"
Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 25 febbraio 2018

**Teatro e Domus - Attività di scavo, restauro e allestimento
didattico per la fruizione pubblica del sito
Importo € 550.000,00**

PROGRAMMA DEI LAVORI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori possono essere suddivisi in categorie omogenee ai fini dell'esecuzione:

1) Impianto cantiere – Opere provvisionali

- Preparazione aree interessate dai lavori
- Impianto cantiere

2) Manutenzione verde

- Disinfestazione parziale in aree limitate
- Rimozione materiali giacenti
- Eliminazione di vegetazione
- Taglio arbusti e potatura piante
- Trasporto a rifiuto di materie vegetali
- Pulizia di murature
- Percorsi e recinzioni

3) Recupero manufatto

- Puntellature ed opere provvisionali (ponteggi e piani chiusi di lavoro)
- Scavo per pavimentazione interna
- Tagli, demolizioni e integrazioni murarie
- Consolidamenti murari
- Realizzazione di divisori
- Realizzazione di servizi e impianti
- Intonaci e tinteggiature

4) Scavo archeologico, saggi e recupero ima e summa cavea

- Puntellature ed opere provvisionali
- Scavo eseguito a mano
- Opere e lavorazioni di supporto
- Manutenzione, indagini e saggi di scavo

- Rinterro di saggi ove occorra
- Consolidamenti e ripristini murari ima e summa cavea
- Noli a supporto delle lavorazioni
- Mano d'opera in economia per lavori non computabili a misura

5) Domus Via Carmine 2

- Scavo eseguito a mano
- Opere e lavorazioni di supporto
- Manutenzione, indagini e saggi di scavo
- Recupero superfici pavimentate
- Consolidamenti murari
- Schermatura perimetrale e pannelli illustrativi

6) Domus Via Carmine 10 (Canonica)

- Scavo eseguito a mano
- Opere e lavorazioni di supporto
- Manutenzione, indagini e saggi di scavo
- Recupero superfici pavimentate
- Consolidamenti murari
- Revisione ed integrazione delle recinzioni


7) Chiusura degli interventi

- Chiusura cantiere

Il programma allegato costituisce una impostazione di massima del programma dei lavori e potrà subire variazioni anche in dipendenza della necessità di assicurare la continuità degli stessi.

Il Progettista

Arch. Pierangelo Izzo




PROGETTO N. ABAP/03/2018

Teatro e Domus - Attività di scavo, restauro e allestimento didattico per la fruizione pubblica del sito del Museo Nazionale del Paleolitico

Importo €. 550.000,00

PROGRAMMA DEI LAVORI IN FUNZIONE DEI PERIODI DI ESECUZIONE

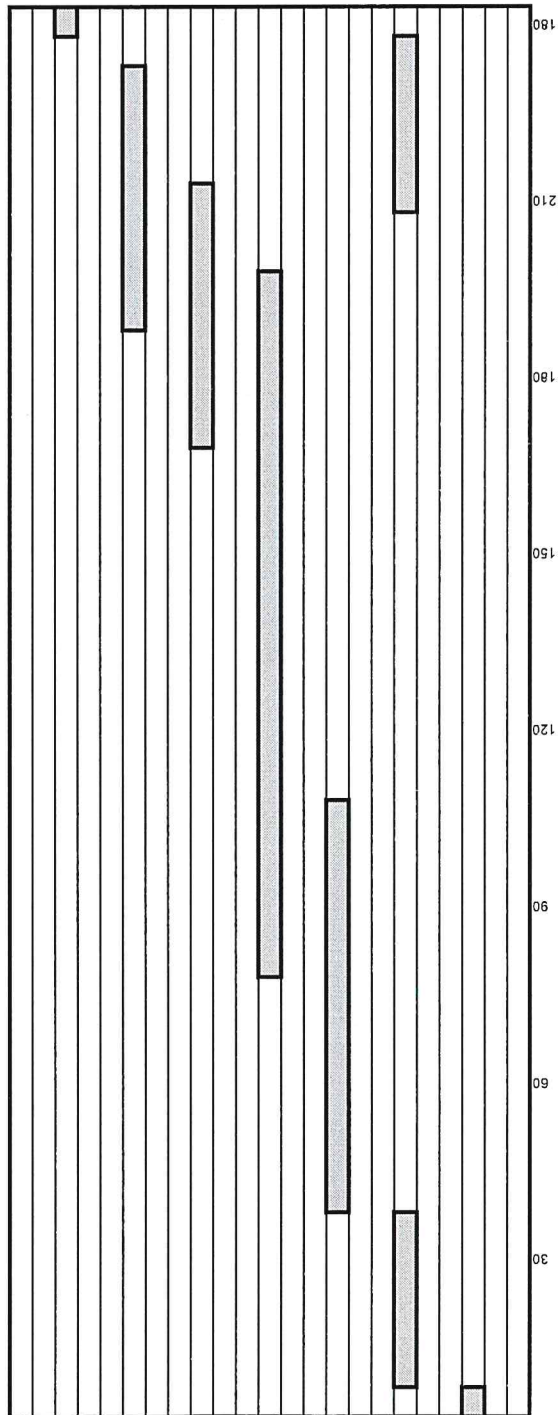

lavori	periodi
Chiusura cantiere	5
Domus Via Carmine 10	45
Domus Via Carmine 2 (Canonica)	45
Scavo archeologico e saggi	120
Recupero manufatto	70
Manutenzione verde	60
Impianto cantiere	5

inizio lavori _____ termine contrattuale _____
